


www.renovogroup.it

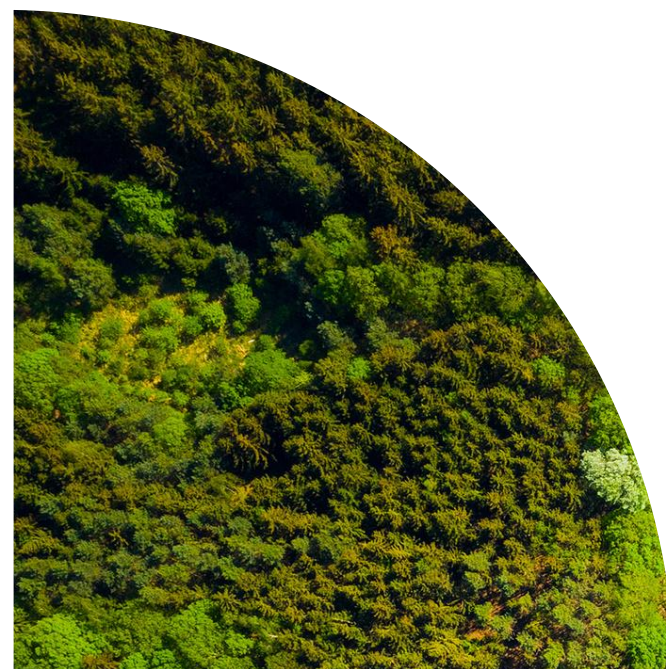

DA BIOGAS A BIOMETANO
**L'EPC come garanzia di efficienza,
sostenibilità e redditività**

Dott. Agr. Alessandro Candian | Renovebio

PIÙ DI 200 IMPIANTI REALIZZATI



Oltre 25 anni di esperienza e competenza per vincere insieme la sfida del BIOMETANO

- **Renovebio** progetta, realizza e gestisce impianti per la produzione di biogas e biometano;
- Divisione di **Renove Group Srl**, attiva nel settore delle energie rinnovabili da oltre 25 anni;
- EPC e General Contractor nel campo delle bioenergie;
- Le grandi opportunità offerte dal Decreto Biometano hanno contribuito al consolidamento della propria presenza nel settore agricolo in Italia;
- Numerosi casi pratici e impianti realizzati all'estero di tipo industriale e agroalimentare.



25 ANNI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

IL GRUPPO

- Il Gruppo nasce nel 1998 con l'obiettivo di implementare un modello di economia circolare in tutti i settori di competenza, attraverso il recupero e la valorizzazione delle risorse già esistenti;
- La vasta esperienza ha permesso a Renove di assumere una posizione di partecipazione diretta in numerosi progetti nel campo delle energie rinnovabili;
- Con le sue Business Unit, continua a mantenere e ad accrescere le proprie competenze tecniche nei settori biogas e biometano, fotovoltaico e agrivoltaico e trattamento delle acque reflue;
- Dal 2023, Marco Mazzero, già Amministratore Delegato di IES Biogas dal 2008 al 2013, entra nel gruppo, portando il know-how e l'esperienza degli oltre 200 impianti realizzati e rafforzando, così, il posizionamento di Renove sia in Italia che all'estero;
- Oltre all'Italia, oggi Renove porta avanti un'intensa attività nell'Europa centrale, Spagna, Grecia e nella regione dei Balcani, dove ha avviato e realizzato la costruzione di diversi impianti di biogas e biometano.

BUSINESS UNIT

Più di 100 persone

Tra dipendenti e collaboratori esterni, sono circa 100 le persone che lavorano nel TEAM di RENOVEBIO.

Un team di biologi, ingegneri, agronomi, informatici, ingegneri di processo ed esperti nel settore delle energie rinnovabili e del biogas: una **STORIA FATTA DI COMPETENZE E CONOSCENZE CONSOLIDATE.**



TEAM RENOVEBIO

- 5 Ingegneri ambientali
- 3 Ingegneri chimici
- 4 Ingegneri elettrici
- 4 Ingegneri informatici
- 3 Ingegneri civili
- 2 Avvocati
- 3 Ingegneri di progetto
- 15 Progettisti
- 40 Operai
- 5 Site Manager
- 3 Agronomi
- 8 Programmatori
- 6 Addetti commerciali



Technical assistance



Plant Management



Remote control and monitoring



Spare parts warehouse



Revamping




Proprietary Software



Biological assistance



In-House automation

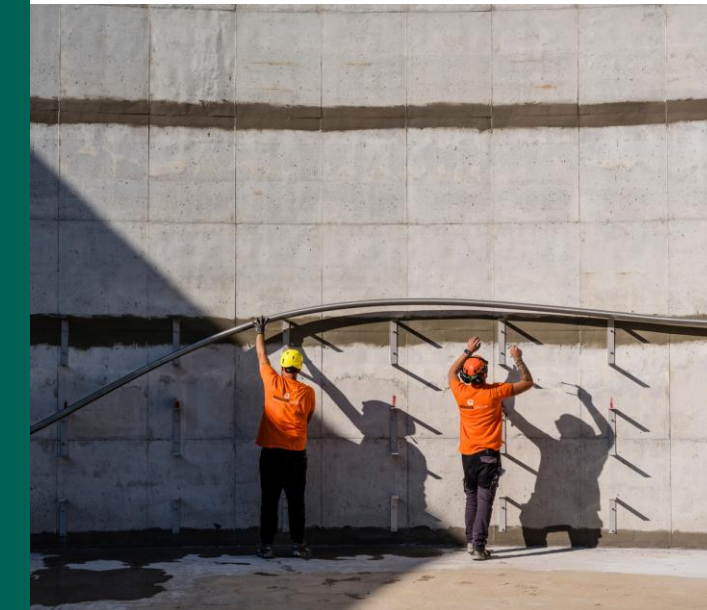

I CLIENTI **RENOVEBIO**

Si presenta sul mercato con una doppia funzione: come EPC e General Contractor, e come investitore nel campo delle bioenergie attraverso investimenti diretti o in collaborazione con altri enti.

- IMPRENDITORI AGRICOLI;
- ALLEVATORI;
- CONSORZI, cooperative, associazioni di fornitori;
- FONDI DI INVESTIMENTO (con attività di costruzione e gestione operativa).



Regenerate**for**Future



**In ITALIA e
nel MONDO**

**Sede centrale a
Padova (ITALIA)**

- Italia
- Spagna
- Bulgaria
- Romania
- Serbia
- Grecia
- Indonesia
- Corea
- Argentina


KEY WINNERS

Accompagniamo le aziende in tutte le fasi del progetto

- Flessibilità;
- Soluzioni personalizzate;
- Prestazioni elevate e efficienza record;
- Innovazione tecnica continua;
- Elevati standard di qualità e sicurezza;
- Assistenza e manutenzione;
- Automazione interna e sofisticato software di controllo remoto;
- Oltre 15 anni di comprovata esperienza.



IMPIANTI CHIAVI IN MANO

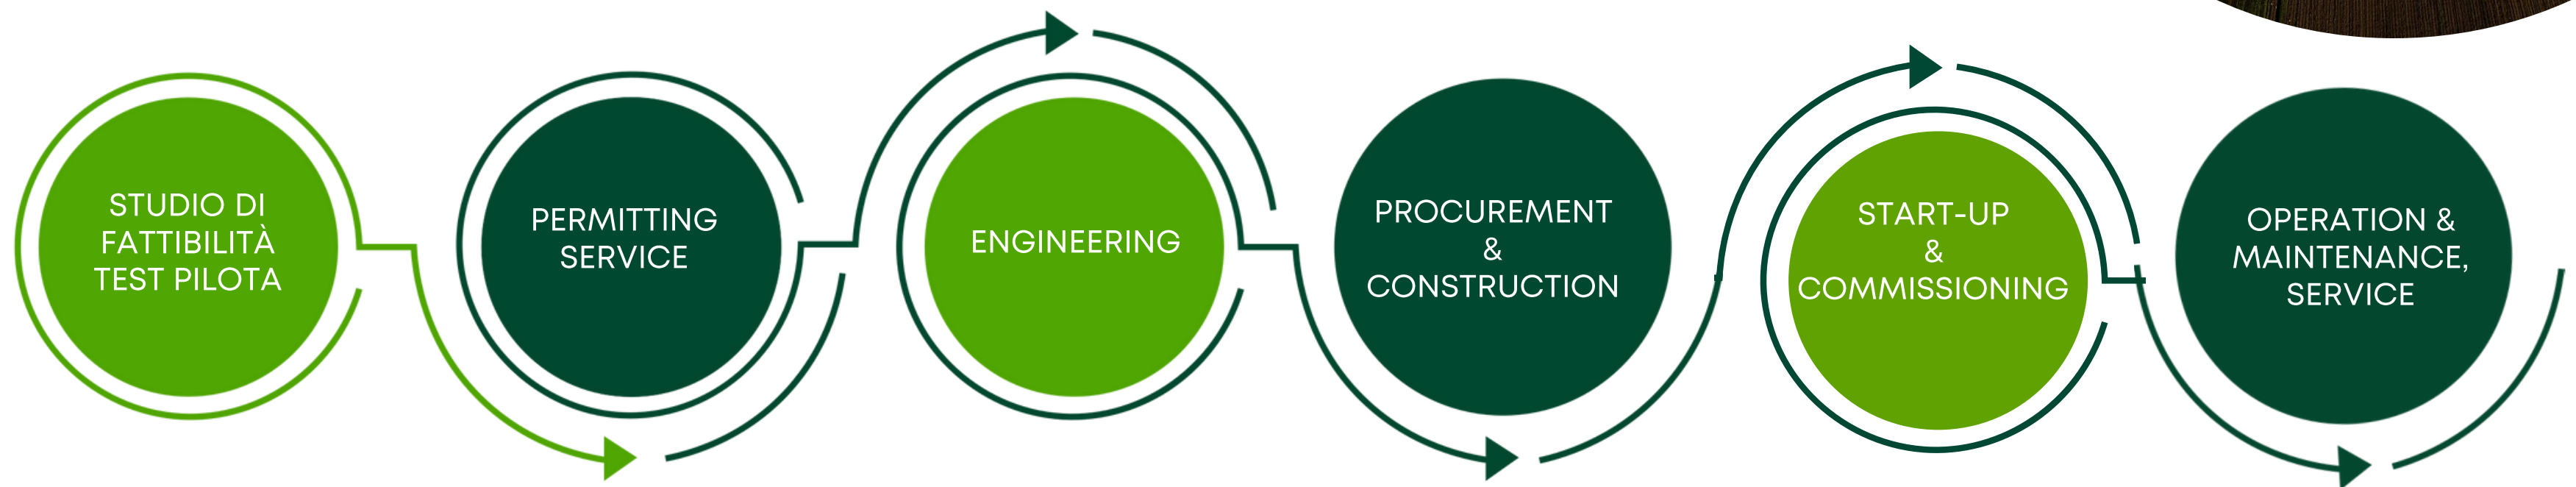

SETTORI DI APPLICAZIONE




AGRI & **FARM**



FOOD & **BEVERAGE**






WASTE

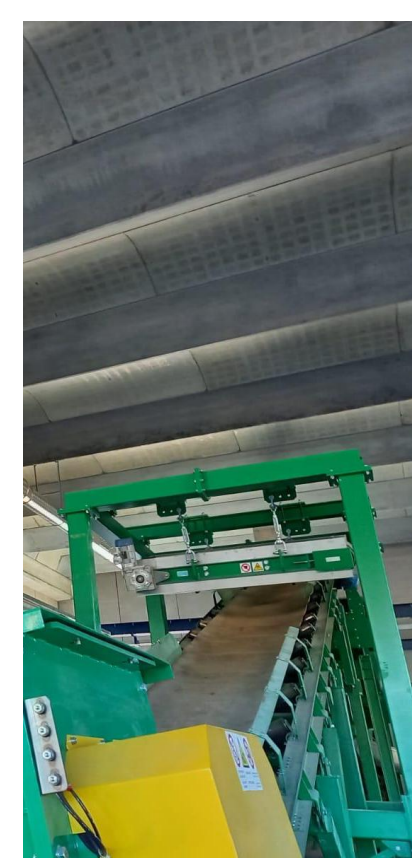

IL RUOLO E LE SOLUZIONI DELL'EPC PER GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA



- **Passaggio di consegna** dalla fase commerciale a quella di ingegneria esecutiva;
- **Ingegneria esecutiva** (EPC/Allineamento cliente – subfornitori – opere civili);
- Qualora necessario **Georadar** (presa visione dei servizi interrati esistenti in relazione al progetto as built e al progetto esecutivo);
- **Timing** nella ricezione e recepimento delle specifiche tecniche dei diversi item a progetto – sezioni di impianto per proseguire nello sviluppo a 360° della commessa;
- **Confronto continuo con il cliente e la Direzione Lavori** per elaborazione, emissione e validazione della soluzione progettuale proposta;
- Ogni **modifica e variazione** progettuale deve essere conforme ai requisiti normativi e autorizzativi sempre nel rispetto di eventuali vincoli.

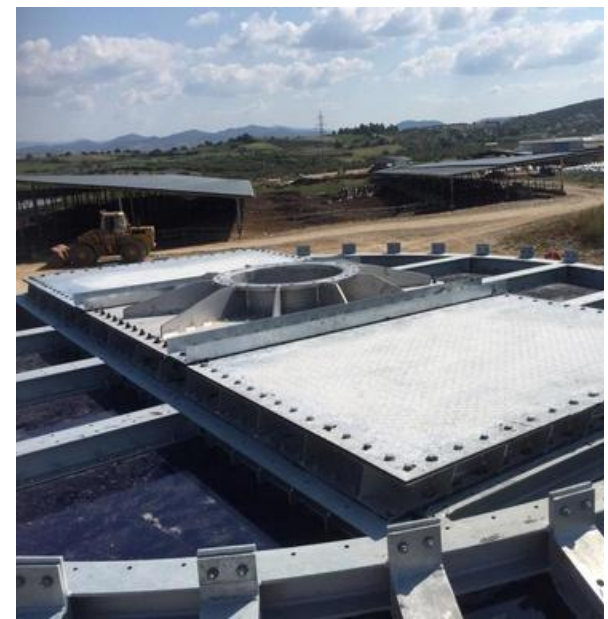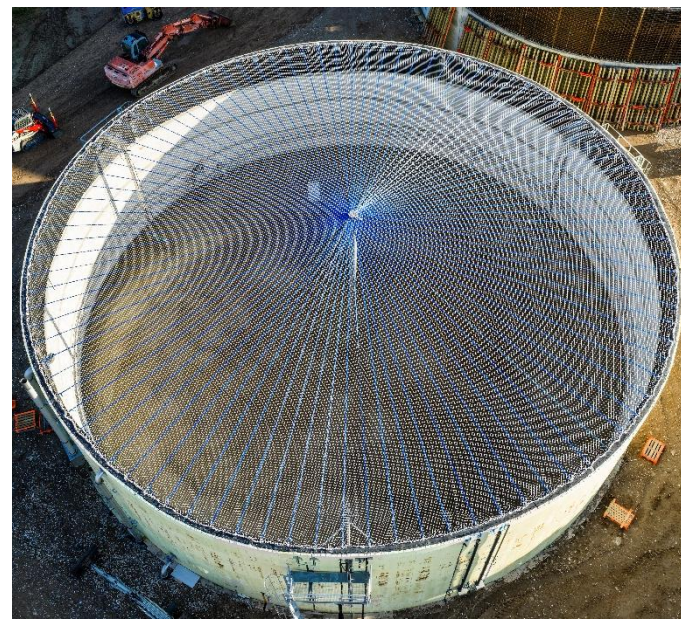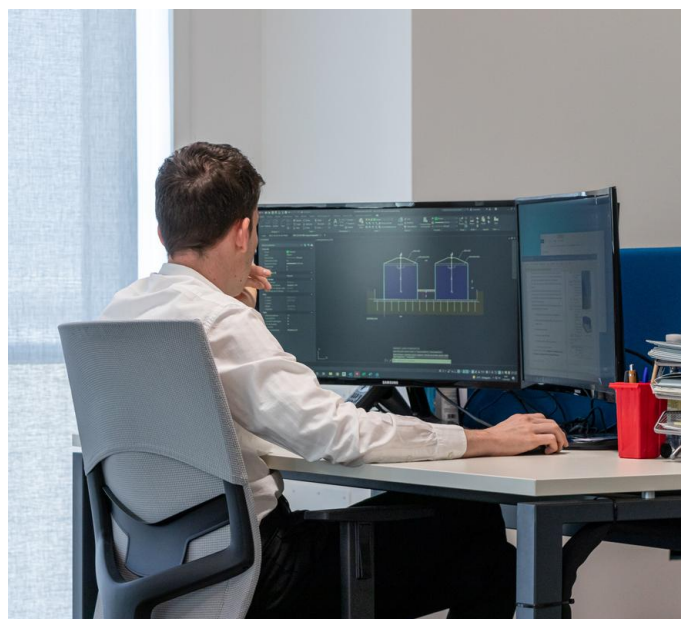

Biometano brownfield: complessità e opportunità



- Gli impianti **brownfield** sono l'evoluzione di strutture biogas esistenti;
- Mantenere **in funzione** l'impianto esistente durante i lavori di conversione pone importanti sfide di **integrazione e coordinamento**;
- La complessità tecnica si traduce in necessità di gestione **efficace**, comunicazione **continua** e visione **sistemica**.

KEY MESSAGE

GESTIRE LA COMPLESSITÀ È IL VERO FATTORE
DI SUCCESSO NEI PROGETTI BROWNFIELD






DALLA FASE COMMERCIALE ALL'INGEGNERIA ESECUTIVA

Passaggio di consegna: dalla proposta al progetto

- Momento cruciale per allineare **obiettivi tecnici, economici e temporali**;
- Necessità di trasferire **tutte le informazioni contrattuali, tecniche e normative** dal team commerciale al team di ingegneria;
- **Definizione chiara** di:
 - Perimetro tecnico della fornitura;
 - Confronto tra opere civili, fornitori e in alcuni casi macchinari acquistati direttamente dal cliente;
 - Responsabilità e milestone.

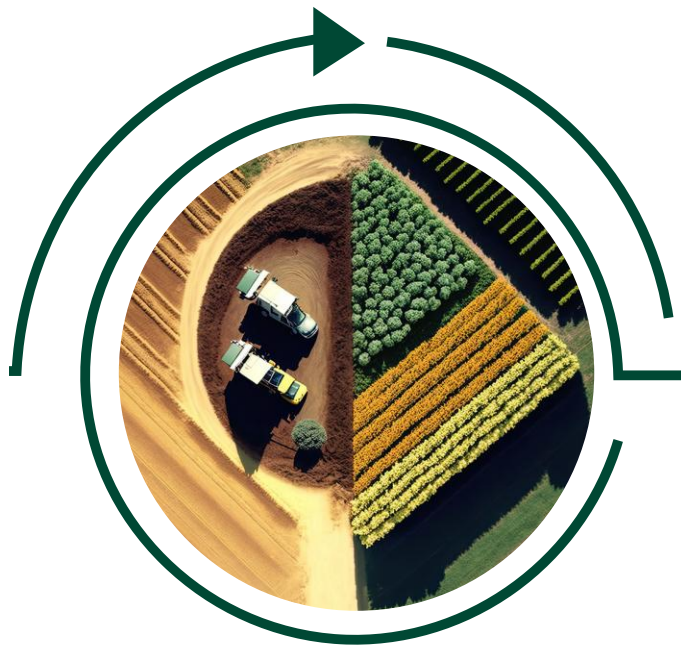

KEY MESSAGE

UN PASSAGGIO DI CONSEGNA STRUTTURATO EVITA
AMBIGUITÀ E RITARDI NELLE FASI SUCCESSIVE

INGEGNERIA ESECUTIVA E COORDINAMENTO INTEGRATO

L'ingegneria come regia del progetto

- Fase di **allineamento** tra EPC, cliente, subfornitori e opere civili;
- Coordinamento **multidisciplinare**: meccanico, elettrico, strumentale, automazione e strutturale;
- **Georadar** per visione sottoservizi esistenti e possibili differenze rispetto alle tavole esecutive dell'impianto oggetto di revamping;
- Gestione delle **interferenze** e delle priorità tra attività in parallelo;
- Necessità di un flusso costante di **aggiornamento e validazione** documentale.

L'EFFICACIA DELL'INGEGNERIA ESECUTIVA
DIPENDE DALLA CAPACITÀ DI INTEGRARE ATTORI E
INFORMAZIONI IN TEMPO REALE

KEY MESSAGE



GESTIONE DEL TIMING E DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Il tempo come risorsa critica




- Tempistiche serrate **nella ricezione, analisi e recepimento delle specifiche tecniche** dei vari item e sezioni di impianto;
- Ritardi o incongruenze possono bloccare lo sviluppo della commessa a 360°;
- Importanza di una pianificazione dinamica e di strumenti digitali per il monitoraggio dell'avanzamento (GANTT integrato).

KEY MESSAGE

IL CONTROLLO DEL TIMING TECNICO È LA CHIAVE PER GARANTIRE EFFICIENZA E RIDURRE RISCHI DI EXTRA COSTI



RENOVEBIO
Biogas & Biomethane

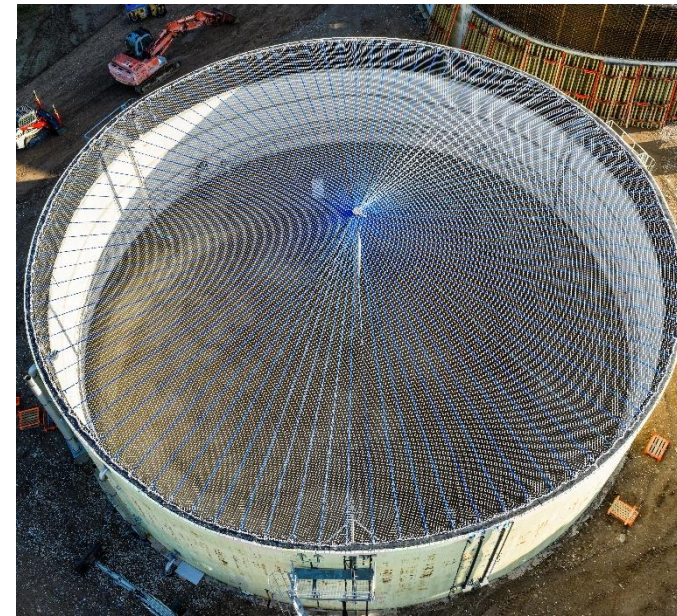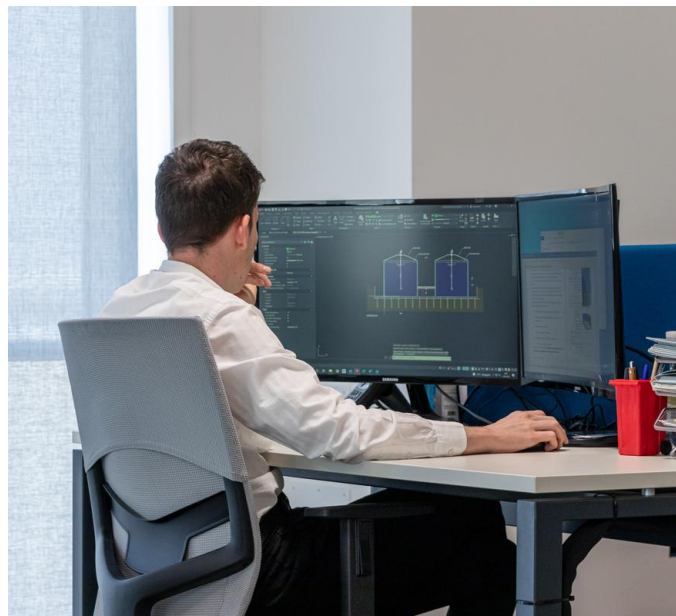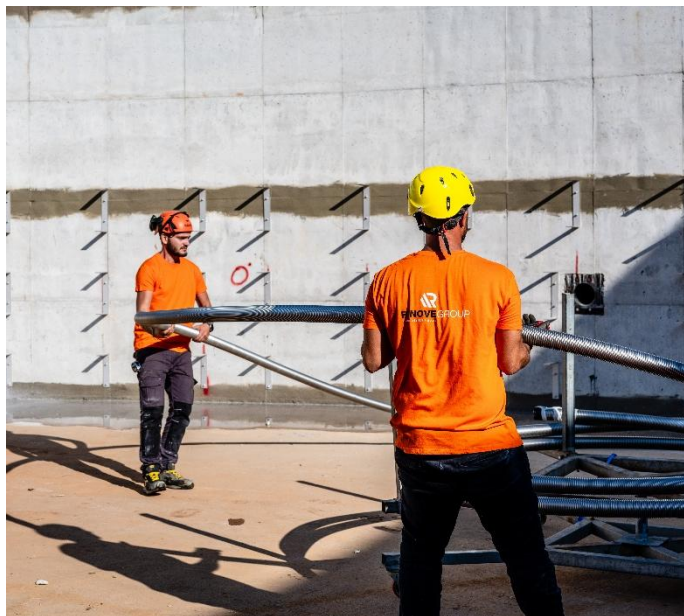

CONFRONTO CONTINUO CON IL CLIENTE

Collaborazione come leva di qualità



- **Ciclo continuo** di elaborazione → emissione → validazione della documentazione;
- Il **confronto costante** con il cliente assicura:
 - Coerenza tra aspettative e fattibilità di realizzazione;
 - Individuazione e risoluzione delle priorità e delle criticità;
 - Il costante avanzamento per il completamento del progetto.
- Favorisce **fiducia reciproca** e riduzione delle varianti in corso d'opera.

LA COMUNICAZIONE PROATTIVA È IL PONTE TRA INGEGNERIA E REALIZZAZIONE



KEY MESSAGE

GESTIONE DELLE MODIFICHE E CONFORMITÀ NORMATIVA

Ogni variazione sotto controllo

Ogni modifica progettuale deve rispettare:

- Requisiti normativi e di sicurezza;
- Vincoli autorizzativi e ambientali;
- Specifiche contrattuali;

Necessario un processo formale di change management, con:

- Analisi dell'impatto;
- Approvazione cliente;
- Aggiornamento documentazione tecnica.



LA FLESSIBILITÀ NON PUÒ PRESCINDERE
DALLA CONFORMITÀ E DALLA TRACCIABILITÀ

KEY MESSAGE



IL RUOLO DELL'EPC COME GARANTE DI EFFICIENZA

EPC: integratore di competenze e risultati

- L'**EPC** coordina e orchestra l'intero processo, assicurando:
 - Coerenza tra le fasi di progettazione-realizzazione-avviamento;
 - Efficienza operativa e gestionale;
 - Qualità e sicurezza in ogni step.



L'EPC EFFICACE NON COSTRUISCE SOLO
IMPIANTI, MA GENERA VALORE
ATTRAVERSO METODO E INTEGRAZIONE

KEY MESSAGE

L'ESPERIENZA DEL PERSONALE DI CANTIERE E IL PROBLEM SOLVING OPERATIVO

L'esperienza in campo: il valore umano nella complessità

- I progetti brownfield richiedono **esperienza diretta sul campo**: nulla è standard, ogni impianto è unico;
- Il **personale di cantiere** rappresenta il ponte tra l'ingegneria e la realtà operativa. E' fondamentale il ruolo delle diverse figure interessate nella fase di construction: PM - site manager e operai specializzati;
- **Problem solving immediato**: capacità di gestire imprevisti tecnici e logistici senza compromettere le tempistiche e la qualità di esecuzione;
- **Competenze trasversali**: interpretare disegni, adattare soluzioni, coordinare subappalti e sicurezza in ambienti complessi;
- L'**esperienza** consente di anticipare criticità, non solo reagire a esse.



KEY MESSAGE

LA COMPETENZA DEL PERSONALE DI CANTIERE È IL FATTORE
INVISIBILE CHE TRASFORMA LA COMPLESSITÀ IN EFFICIENZA

- Nei progetti brownfield, la **fase di costruzione** è dove la teoria incontra la realtà: spazi limitati, strutture preesistenti e tempi ristretti. In questo contesto, il personale di cantiere esperto diventa determinante;
- Non si tratta solo di eseguire, ma di **interpretare e adattare le soluzioni progettuali**, gestendo imprevisti tecnici, interferenze o eventuali variazioni in corso d'opera;



- Un **team con forte background operativo** è in grado di:
 - Valutare rapidamente le alternative e la loro fattibilità tecnica;
 - Prendere decisioni in autonomia;
 - Garantire la sicurezza e la qualità durante il corso delle diverse lavorazioni;
 - Dialogare in modo efficace con ingegneri e project manager per proporre soluzioni praticabili.
- L'esperienza di campo permette di **ridurre tempi di fermo**, minimizzare varianti e migliorare la qualità finale delle lavorazioni;
- In un impianto brownfield, questa capacità di **problem solving è un asset strategico** tanto quanto la tecnologia installata.

Work in progress: alcuni dei 35 progetti in corso





CONCLUSIONI

Governare la complessità, creare valore

I progetti **brownfield** richiedono:

- Gestione rigorosa ma flessibile;
- Comunicazione trasparente;
- Piena tracciabilità delle decisioni tecniche.

Solo una **regia EPC solida** può tradurre la complessità in efficienza e performance duratura.

*La complessità non si elimina: si governa.
Farlo bene significa garantire valore e
sostenibilità nel tempo.*



RENOVEBIO

Biogas & Biomethane

www.renovbio.it

Fieragricola 2026

PAD 11 STAND C4

Rigenerate for future

www.renovetbio.it



RENOVEBIO

Biogas & Biomethane
